


浸水対策


8月の工事状況おしらせ

発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
 受注者：西松・時里特定JV

池町川地下調節池（大隈公園）築造関連工事

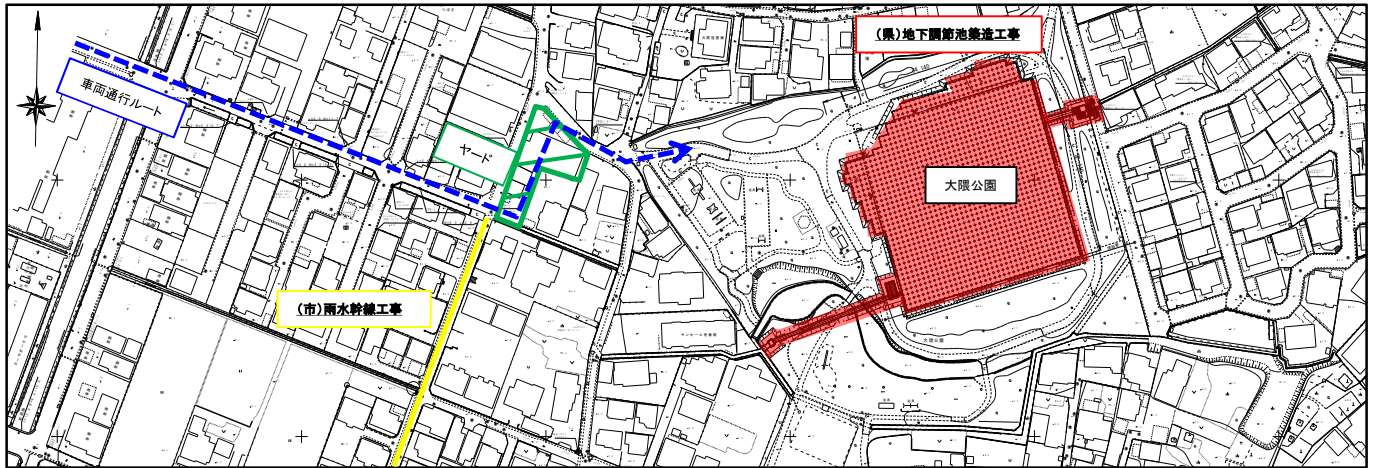

貯留施設工 進捗

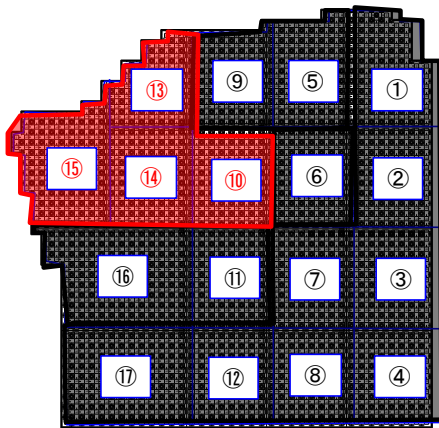

■ 施工済
 ■ 施工中

△埋戻し作業も行います

8月は、⑤⑨ブロックの貯留施設の設置を行いました。9月からは引き続き、設置作業と同時並行でグラウンドの埋戻し作業を行っていきます。また、資材・土の運搬に伴うダンプトラックの通行及びコンクリート打設に伴う生コン車の通行があります。今後も安全に十分配慮し、工事を進めていきますので、工事へのご理解・ご協力のほど、よろしくお願いします。



※R5.8月末時点

貯留施設の設置を行っています

ブロックごとに設置を行っており、①～⑨、⑪⑫⑩⑰ブロックの施工が完了しました！

9月の工事予定内容

- 引き続き、貯留施設の設置及びグラウンドの埋戻しを行います。

作業内容	時期	工事場所	時期			備考
			上旬	中旬	下旬	
貯留施設工		大隈公園				資材及び生コン運搬のために、ダンプトラックと生コン車が毎週通行します。
埋戻し工		大隈公園				土の運搬のために、ダンプトラックが毎週通行します。

関連情報は
こちら

