


池町川第二放水路(仮称)築造工事 令和7年1月号


浸水対策

池町川第二放水路関連工事

工事状況おしらせ



発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
受注者：安藤ハザマ・日本国土開発・井樋特定JV

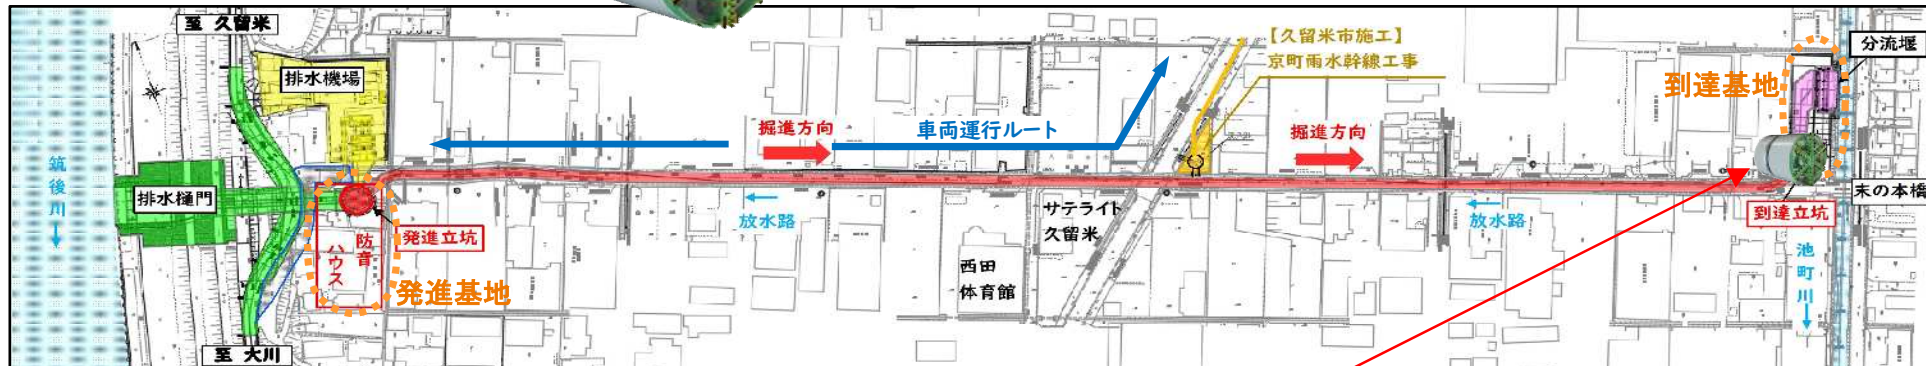

12/6時点
シールド機所定位置到達

道路幅員の減少、工事車両の出入り等によりご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。



12月の工事進捗

- 【発進基地】シールド機による掘進、坑内設備の撤去を行いました。
- 【到達基地】シールド機の解体を開始しました。



坑内状況



到達立坑内状況
(シールド機所定位置到達)



到達立坑内状況
(シールド機所定位置到達)

1月の工事予定内容

- 【発進基地】仮設備撤去工、急曲線被覆工を行います。
- 【到達基地】シールド機解体工を行います。

工事箇所	作業内容	1月			備考
		上旬	中旬	下旬	
発進基地	仮設備撤去工				
	急曲線被覆工				
到達基地	シールド機解体工				

関連情報は
こちら



工程計画	R5年度				R6年度			
	4月	7月	10月	令和6年 1月	4月	7月	10月	令和7年 1月
	発進立坑築造				到達立坑築造			
				シールドマシン・防音ハウス組立		シールド掘進工		撤去工
