

池町川第二放水路(仮称)築造工事 令和7年3月号

浸水対策

池町川第二放水路関連工事


工事状況おしらせ



発注者：福岡県 久留米県土整備事務所



受注者：安藤ハザマ・日本国土開発・井樋特定JV

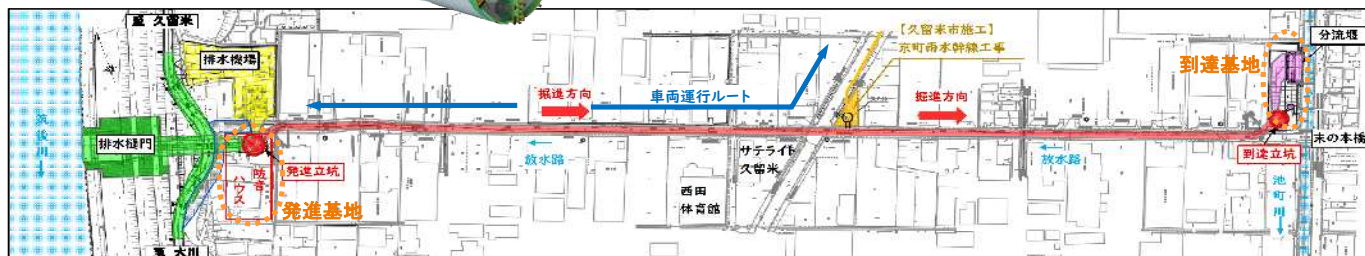

道路幅員の減少、工事車両の出入り等によりご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

2月の工事進捗

【発進基地】防音ハウス解体工を行いました。

【到達基地】シールド機解体工、仮設備撤去工、急曲線部被覆工を行いました。



防音ハウス解体状況



坑内状況
(発進側 急曲線部被覆工完了)



到達立坑内状況
(シールド機解体完了)

3月の工事予定内容

【発進基地】防音ハウス解体工、仮設備撤去工を行います。

【到達基地】急曲線部被覆工、仮設備撤去工を行います。

工事箇所	作業内容	3月			備考
		上旬	中旬	下旬	
発進基地	防音ハウス解体工	■	■		
	仮設備撤去工		■	■	
到達基地	急曲線部被覆工	■			
	仮設備撤去工		■		

関連情報は
こちら



工程計画	R5年度				R6年度			
	4月	7月	10月	令和6年 1月	4月	7月	10月	令和7年 1月
	発進立坑築造				到達立坑築造			
				シールドマシン・防音ハウス組立		シールド掘進工		撤去工
