

池町川地下調節池（けやき通り）築造工事

令和7年3月号

浸水対策

工事状況おしらせ



発注者：福岡県 久留米県土整備事務所




受注者：（3工区）大豊・森本・濱崎特定JV

（4工区）鴻池・新井・九州環境特定JV

（分土工1，2工区）（株）高木組

池町川地下調節池（けやき通り）築造関連工事

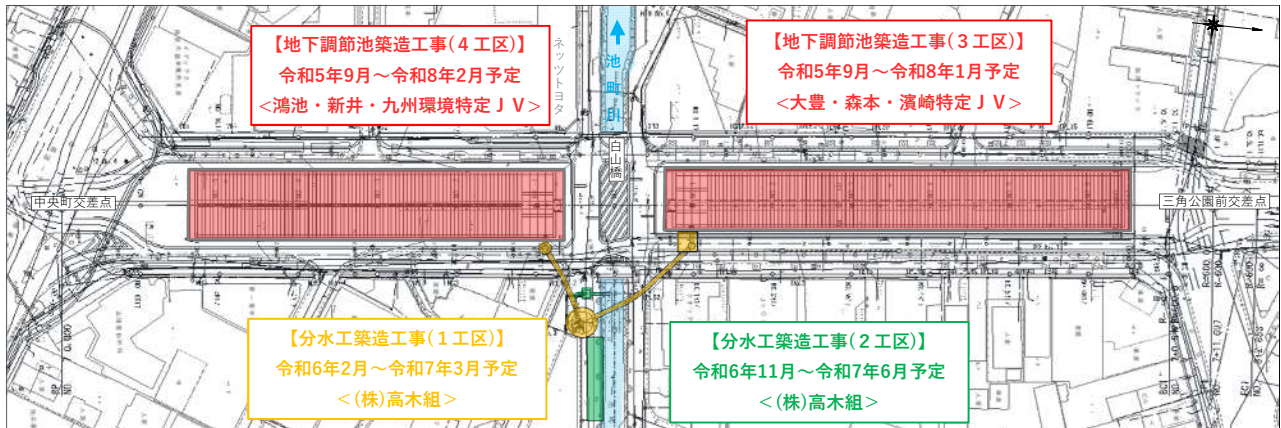

2月の工事進捗

○ 調節池部材の据付、分土工 本土工（コンクリート打設など）を進めました。



調節池内の整備状況（地下調節池築造工事）



分土工の施工状況（分土工築造工事）



分土工の完成イメージ（参考）

3月の工事予定内容

○ 調節池部材の据付工、分土工 本土工（コンクリート打設など）等を実施します。

工事箇所	作業内容	時期			工事業者	備考
		上旬	中旬	下旬		
地下調節池 (3工区)	調節池部材 据付工				大豊・森本・濱崎 特定JV	大型H-ラー等の出入りが あります。(最大5台/日)
地下調節池 (4工区)	調節池部材 据付工				鴻池・新井・九州環境 特定JV	大型H-ラー等の出入りが あります。(最大3台/日)
分土工 (2工区)	分土工 本土工				(株)高木組	大型車(生刈車等)の出入りが あります。(最大30台/日)

関連情報は
こちら



○ 関連工事の工期延長を行います

- ・ 地下水の影響による掘削工事の難航や地下調節池の構造変更を行ったことなどにより関連工事の工期を延長します

（工期末）

地下調節池築造工事（3工区）：大豊・森本・濱崎JV
地下調節池築造工事（4工区）：鴻池・新井・九州環境JV
分土工築造工事（2工区）：（株）高木組

変更前
令和7年3月 ⇒ 変更後
令和8年1月
令和7年3月 ⇒ 令和8年2月
令和7年3月 ⇒ 令和7年6月（予定）

- ・ 地域の皆様を始め関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、地下調節池築造工事完成後の道路復旧を含め、事業の早期完成に向けて努めてまいりますので、引き続きご協力をお願いいたします
