

池町川地下調節池（けやき通り）築造工事 令和7年8月号

浸水対策

工事状況おしらせ

池町川地下調節池（けやき通り）築造関連工事

※ 発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
 ※ 受注者：（3工区）大豊・森本・濱崎特定JV
 （4工区）鴻池・新井・九州環境特定JV
 （分水工3工区）（株）佐田土木

平常時

池町川

暫定運用の状況

R7. 7. 19
17:05

池町川

←--- : 調節地までの流れ

池町川


右岸側

左岸側

調節池内の貯留状況

R7. 7. 8

地下調節池（けやき通り）は工事中ですが、池町川が増水した場合には、右岸側調節池内に貯留できるよう暫定運用を行っています。 ※写真は7月8日、19日の状況です

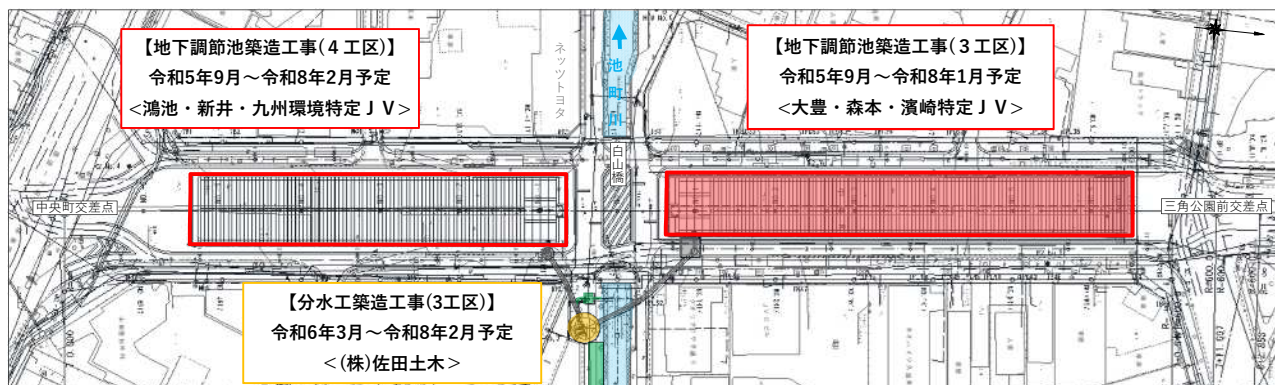

8月の工事予定内容

○ 調節池部材（頂版）の据付工、調節池本体コンクリート打設工を実施します。

工事箇所	作業内容	時期	上旬	中旬	下旬	工事業者	備考
地下調節池(3工区)	調節池部材据付工（頂版）等					大豊・森本・濱崎特定JV	大型トレー等の出入りがあります。（最大5台/日）
地下調節池(4工区)	調節池本体コンクリート打設工等					鴻池・新井・九州環境特定JV	大型車(生引車等)の出入りがあります。（最大20台/日）

関連情報は
こちら



7月の工事進捗


○ 調節池部材（頂版等）の据付工、分水工本體工（埋め戻しなど）を実施しました。



施工状況（分水工）



施工状況（地下調節池3工区）

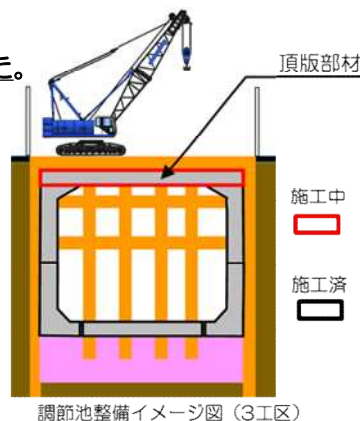

調節池整備イメージ図（3工区）
