


浸水対策


工事状況おしらせ

池町川地下調節池（けやき通り）築造関連工事

※ 発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
受注者：（3工区）大豊・森本・濱崎特定JV
（4工区）鴻池・新井・九州環境特定JV
（分水工3工区）（株）佐田土木

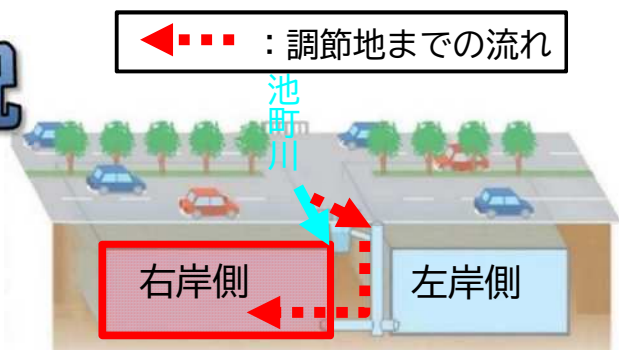

地下調節池（けやき通り）は工事中ですが、池町川が増水した場合には、右岸側調節池内に貯留できるよう暫定運用を行っています。6/23、7/8、7/19、8/10～11の降雨時に貯留しました。
※暫定運用は令和7年9月末までを予定しており、10月以降は貯留を行わず、本格運用に向けて工事を進めます。

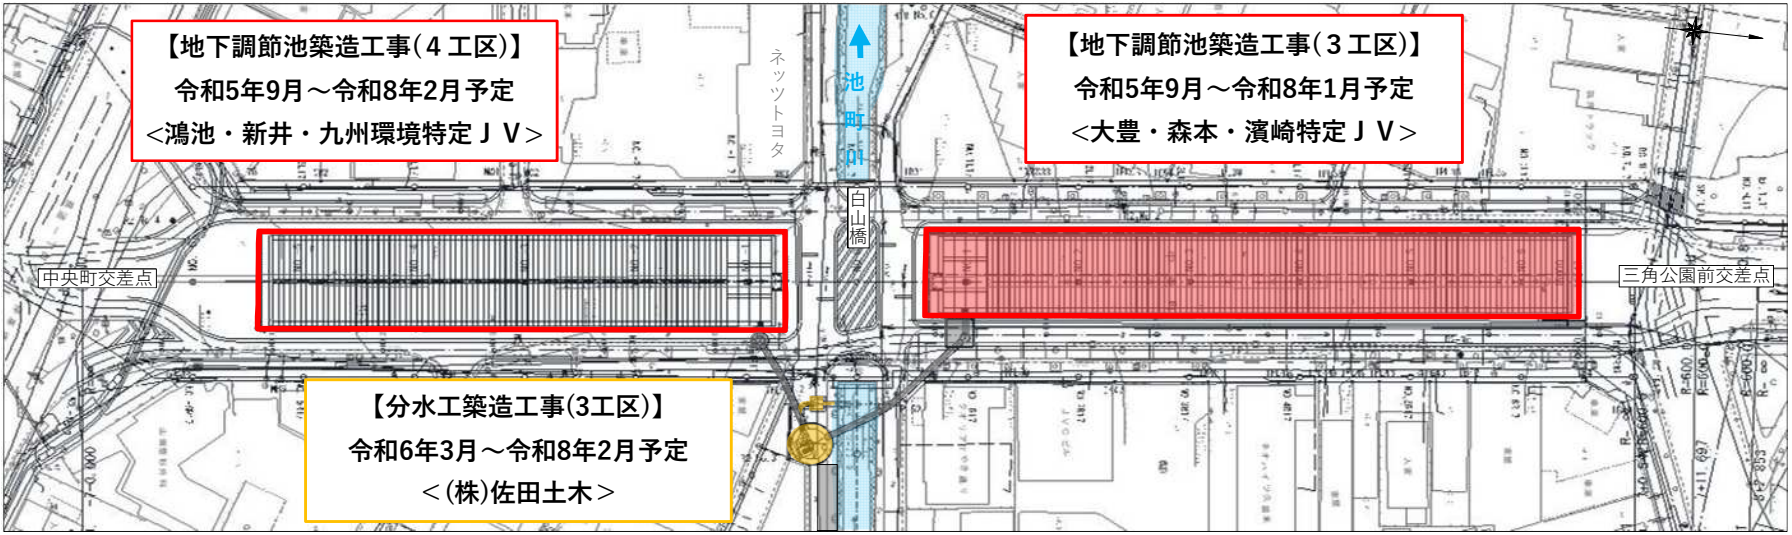

9月の工事予定内容

○ 調節池部材（頂版）の据付工、放流工土工等を実施します。

工事箇所	作業内容	時期	上旬	中旬	下旬	工事業者	備考
地下調節池（3工区）	調節池部材据付工（頂版）等					大豊・森本・濱崎特定JV	大型トレー等の出入りがあります。（最大5台/日）
地下調節池（4工区）	調節池部材据付工（頂版）等					鴻池・新井・九州環境特定JV	大型トレー等の出入りがあります。（最大6台/日）
分水工（3工区）	放流工土工・鉄筋工等					（株）佐田土木	大型車（ダンプ等）の出入りがあります。（最大12台/日）

関連情報は
こちら

8月の工事進捗


○ 調節池部材（頂版等）の据付工、調節池本体コンクリート打設を実施しました。



施工状況（地下調節池4工区）



施工状況（地下調節池3工区）

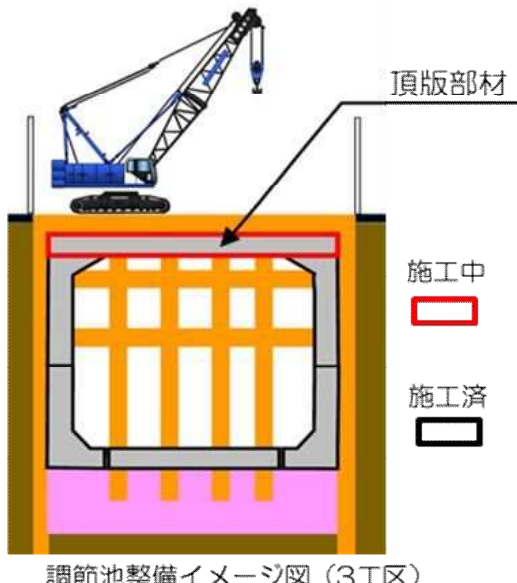

調節池整備イメージ図（3工区）
