


池町川地下調節池（けやき通り） 築造工事

令和7年10月号

工事状況おしらせ

✿ 発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
 🚧 受注者：(3工区) 大豊・森本・濱崎特定JV
 (4工区) 鴻池・新井・九州環境特定JV
 (分水工3工区) (株)佐田土木

6月～9月の間、暫定運用を行いました。



← : 調節地までの流れ

地下調節池（けやき通り）は工事中ですが、6月～9月の降雨時に、右岸側調節池内に貯留させる暫定運用を下記のとおり行いました。


非出水期を迎え、工事進捗を図ってまいります。

日時	貯留量	25mプール換算
令和7年6月23日	約 900m ³	約 3個分
令和7年7月8日	約 2,100m ³	約 7個分
令和7年7月19日	約 4,900m ³	約16個分
令和7年8月10～11日	約 300m ³	約 1個分

※プール1個を300m³で計算



10月の工事予定内容

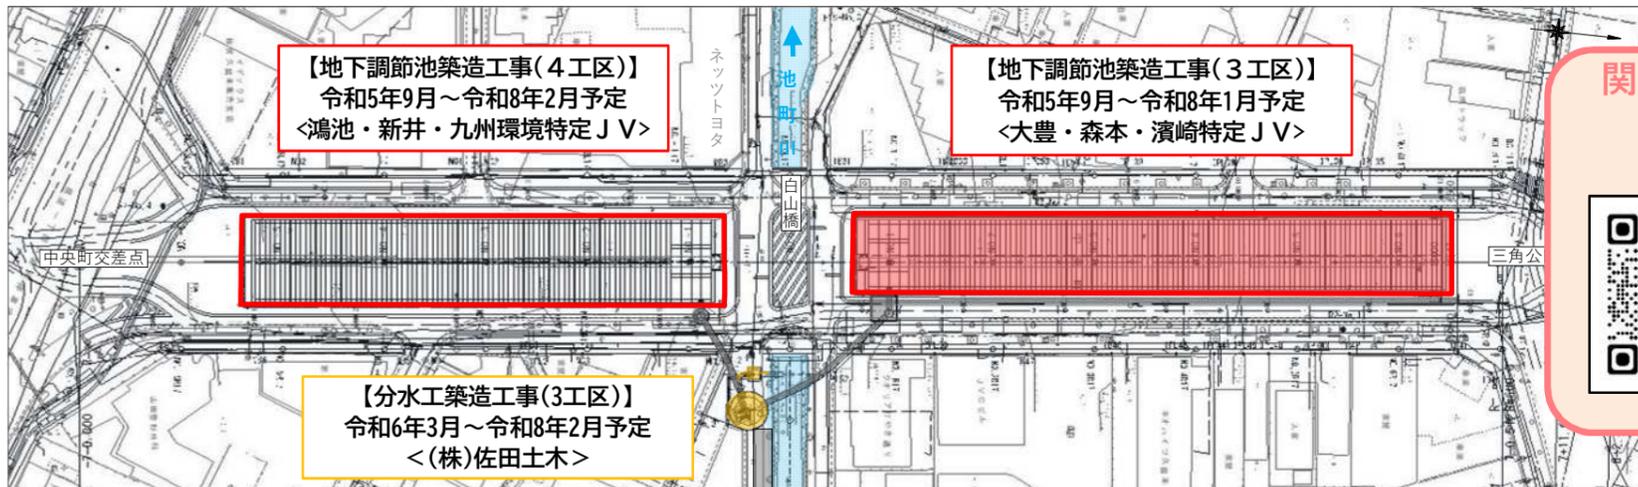

● 調節池部材（頂版）の据付工、流入立坑の二次覆工等を実施します。

工事箇所	作業内容	時期			工事業者	備考
		上旬	中旬	下旬		
地下調節池 (3工区)	調節池部材 据付工 (頂版) 等	■	■	■	大豊・森本・濱崎 特定JV	大型トレー等の出入りがあります。(最大26台/日)
地下調節池 (4工区)	調節池部材 据付工 (頂版) 等	■	■	■	鴻池・新井・九州環境 特定JV	大型トレー等の出入りがあります。(最大6台/日)
分水工 (3工区)	流入立坑 二次覆工等	■	■	■	(株)佐田土木	大型車(ダンプ等)の出入りがあります。(最大16台/日)

9月の工事進捗


● 調節池部材（頂版等）の据付工、放流工の土工・鉄筋工を実施しました。



施工状況（地下調節池4工区）



施工状況（地下調節池3工区）

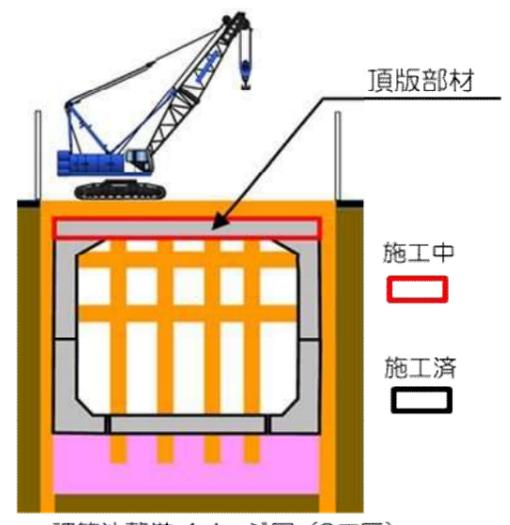

調節池整備イメージ図（3工区）
