


池町川地下調節池（けやき通り）関連工事

令和7年12月号

工事状況おしらせ

福岡県 久留米県土整備事務所

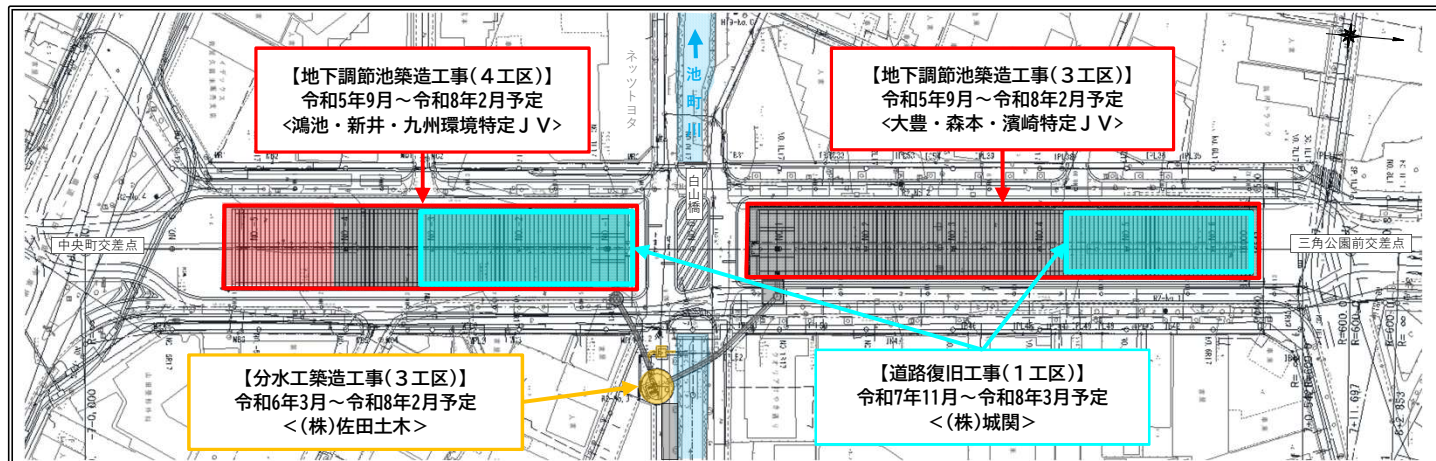

11月の工事進捗

- 調節池部材（頂版等）の据付工、流入立坑内部をコンクリートで覆う工事等を進めました。



12月の工事予定

- 調節池部材（頂版）の据付工、流入立坑内部をコンクリートで覆う工事等を実施します。

工事箇所	作業内容	時期	上旬	中旬	下旬	工事業者	備考
地下調節池（3工区）	調節池内部防水工等					大豊・森本・濱崎特定JV	大型クレーンの出入りがあります。（最大3台/日）
地下調節池（4工区）	調節池部材（頂版）据付工等					鴻池・新井・九州環境特定JV	大型トレーラー等の出入りがあります。（最大10台/日）
分水工（3工区）	流入立坑二次覆工等					(株)佐田土木	大型車(ダンプ等)の出入りがあります。（最大22台/日）
道路復旧（1工区）	測量等					(株)城関	-

※ 立坑二次覆工とは、立坑内部をコンクリートで覆う工事です

関連情報は
こちら



○ けやき通りの道路復旧工事を始めます

- ・ けやき通りを復旧するために、調節池の頂版に盛り土を行う道路工事に着手します。調節池の工事と並行し、仮設防護柵で囲われている範囲内での作業となります。

工事名：池町川地下調節池（けやき通り）道路復旧工事（1工区）

業者名：（株）城関

工期：～令和8年3月

- ・ 地域の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、早期完成に向けて努めてまいりますので、引き続きご協力をお願いいたします。

※令和8年の梅雨時期には、地下調節池の本格運用ができるよう工事を進めてまいります。
