


池町川第二放水路(仮称)関連工事

令和8年2月・3月号

工事状況おしらせ

福岡県久留米県土整備事務所

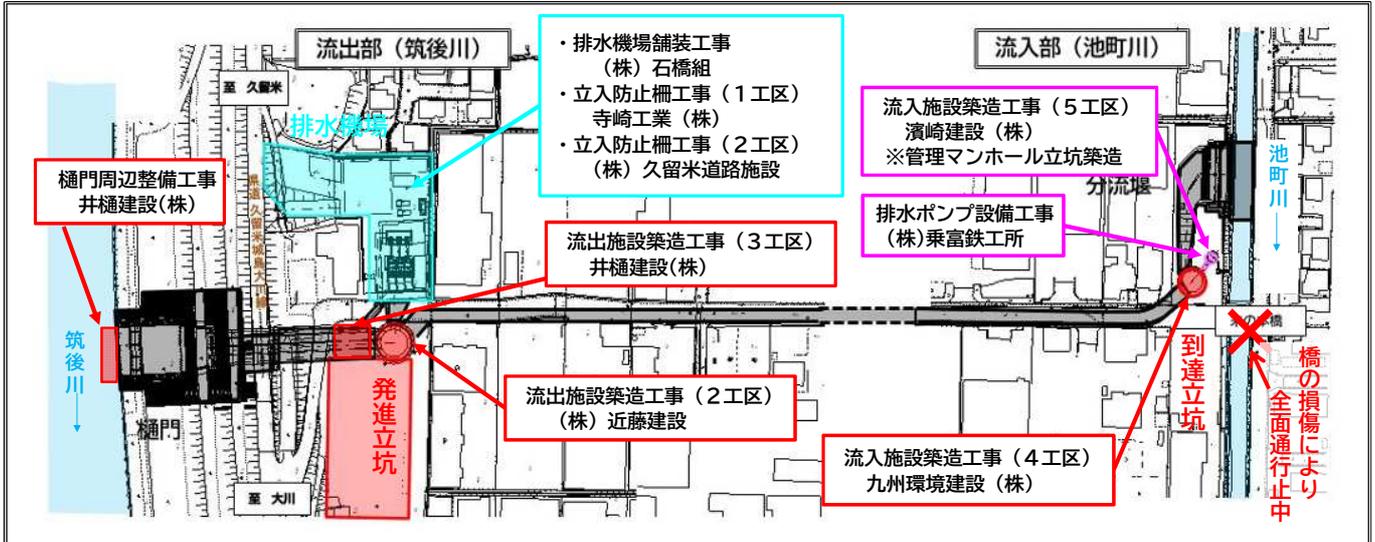

2月の工事進捗

- 【排水機場】・排水機場内の造成工事が完了しました。
- 【流出部】・立坑上部の鋼材の撤去作業を行いました。
・立坑内で側壁部のコンクリート打設を行いました。(17mのうち、約9m完成)
- 【流入部】・管理マンホールの掘削・据付作業を行いました。
・立坑内で側壁部のコンクリート打設を行いました。(19mのうち、約12m完成)

【排水機場】造成工事

【流出部】側壁部打設

【流入部】管理マンホール築造



3月の工事予定

- 【排水機場】・排水機場内の舗装及び立入防止柵の設置を行います。
- 【流出部】・立坑内で側壁部のコンクリート打設作業を行います。
- 【流入部】・管理マンホールのコンクリート打設作業を行います。
・立坑内で側壁部のコンクリート打設作業を行います。

工事箇所	作業内容	時期			備考
		上旬	中旬	下旬	
排水機場	・舗装 ・立入防止柵設置				大型車(ダンプ等)の出入り (最大6台/日)
流出部	・立坑内で側壁部のコンクリート打設				大型車(ダンプ等)の出入り (最大75台/日)
流入部	・立坑内で側壁部のコンクリート打設				大型車(ダンプ等)の出入り (最大21台/日)
	・管理マンホールのコンクリート打設				

関連情報は



※令和8年の梅雨時期には、本格運用できるよう、工事を進めてまいります。
