


## 工事状況おしらせ

福岡県 久留米県土整備事務所

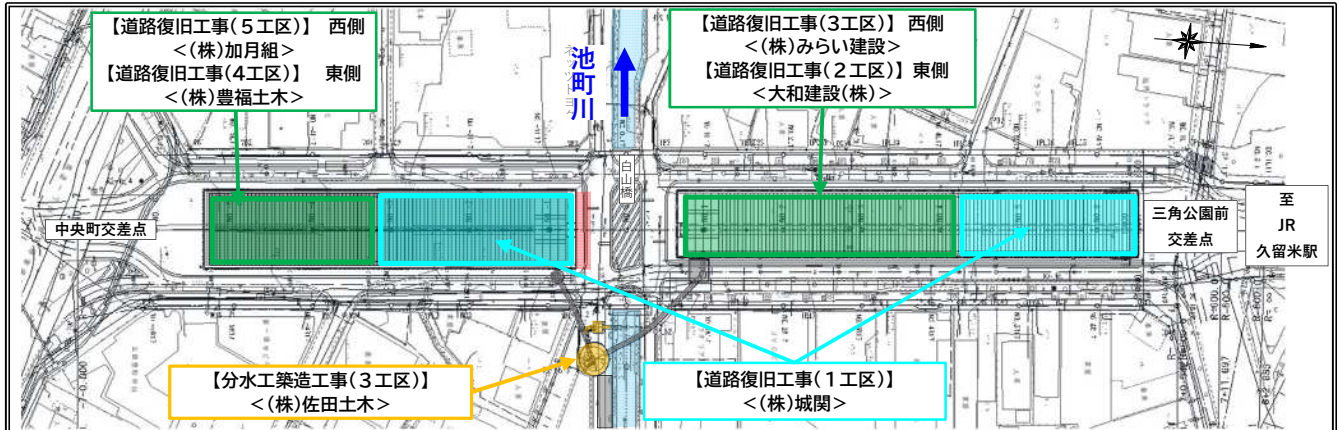

### 4月の工事進捗

- 流入立坑の蓋の設置を行いました。
- 道路復旧の盛土工、路盤工などを進めました。

5月中旬より車線切替に伴い、仮囲いを順次撤去いたします。


施工状況：分水工3工区



左岸側：施工状況 (R8.4末時点)



施工状況：右岸側 (R8.4末時点)




### 5月の工事予定

- 分水工護岸復旧工事、道路復旧工事（盛土工、路盤工）などを実施します。

工事箇所	作業内容	時期			工事業者	備考
		上旬	中旬	下旬		
分水工 (3工区)	護岸復旧工等	■	■	■	(株)佐田土木	大型車(ダンプ等)の出入り (最大10台/日)
道路復旧 (1工区)	左岸：下層路盤工等 右岸：縁石工等	■	■	■	(株)城関	大型車(ダンプ等)の出入り (最大14台/日)
道路復旧 (2工区)	下層路盤工等	■	■	■	大和建设(株)	大型車(ダンプ等)の出入り (最大15台/日)
道路復旧 (3工区)	下層路盤工等	■	■	■	(株)みらい建設	大型車(ダンプ等)の出入り (最大15台/日)
道路復旧 (4工区)	準備工	■	■	■	(株)豊福土木	-
道路復旧 (5工区)	準備工	■	■	■	(株)加月組	-

関連情報は  
こちら



**今年の梅雨時期(6月)から、地下調節池の本格運用を開始する予定です。**  
道路復旧工事につきましては、**令和8年度末(2027年3月末)に完了できる**よう工事を進めてまいります。

ご迷惑をおかけしますが、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
