

池町川地下調節池（けやき通り）築造工事 令和7年7月号

浸水対策

工事状況おしらせ



※発注者：福岡県 久留米県土整備事務所
受注者：（3工区）大豊・森本・濱崎特定JV
（4工区）鴻池・新井・九州環境特定JV
（分土工3工区）（株）佐田土木

池町川地下調節池（けやき通り）築造関連工事

大雨時の工事中の施設の活用について

浸水被害を軽減するため
大雨時には工事中の施設を活用します
（6月中旬から開始）

- ・池町川が増水した場合は、右岸側調節池（地下調節池築造工事3工区）に貯留します。
- ・最大で約12,000m³の貯留が可能です。

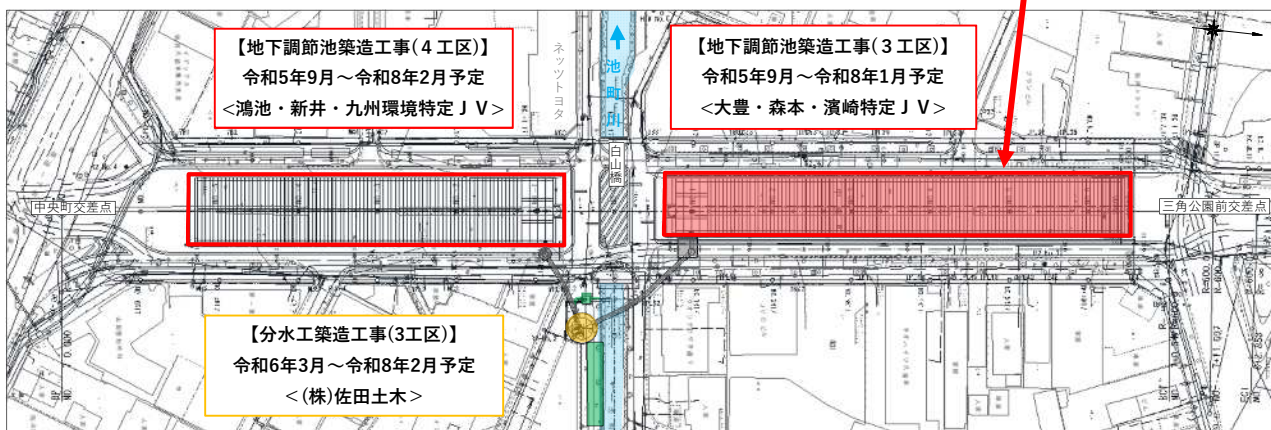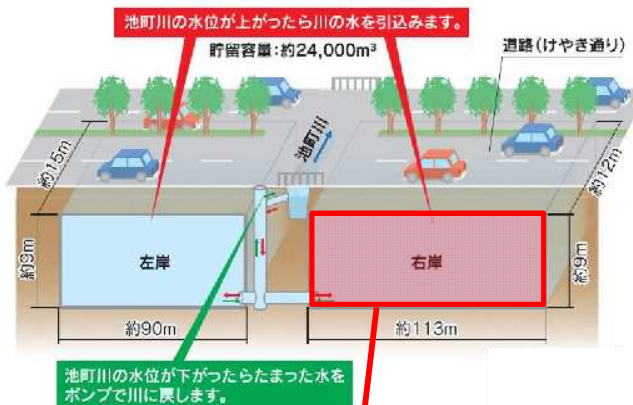

7月の工事予定内容

○ 調節池部材（頂版）の据付工、調節池本体コンクリート打設工を実施します。

工事箇所	時期 作業内容	上旬	中旬	下旬	工事業者	備考
地下調節池(3工区)	調節池部材据付工（頂版）等				大豊・森本・濱崎特定JV	大型トラック等の出入りがあります。（最大5台/日）
地下調節池(4工区)	調節池本体コンクリート打設工等				鴻池・新井・九州環境特定JV	大型車(生)車等の出入りがあります。（最大20台/日）

関連情報は
こちら



6月の工事進捗


○ 調節池部材（頂版等）の据付工、分土工本工（埋め戻しなど）を実施しました。



施工状況（分土工）



施工状況（地下調節池3工区）

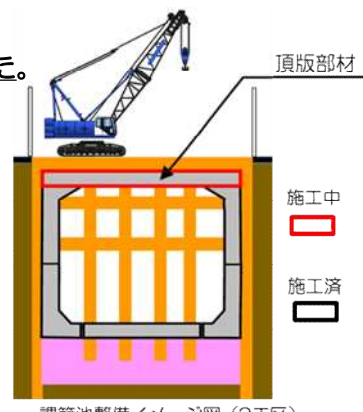

調節池整備イメージ図（3工区）
